



MEMORANDO DZON-ST-097-2024

PARA: DIRECTOR DZON (E)
GERENTE DE OBRAS DEL CONTRATO

DE: FISCALIZADOR

ASUNTO: INFORME PARA PAGO DE PLANILLA 2 DEL CONTRATO 126-2023

FECHA: FEBRERO 07, 2024

Mediante trámite sissol 2024-2840 de entrega de planillas de avance 2 del contrato 126-2023, luego de verificada la información por fiscalización se informa lo siguiente:

Contrato de trabajo No:	126-2023 (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-007)	
Fecha de suscripción del contrato:	11 de septiembre de 2023	
Fecha de inicio contrato (día establecido por el administrador del contrato):	19 de septiembre de 2023	Oficio EEASA-DZON-DIR-122-2023
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIALES, DIRECCIÓN TÉCNICA Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA	
Valor del contrato sin IVA:	US\$ 251,366.78	
Plazo:	Ciento ochenta (180) días calendario	
Ampliación de plazo:	No aplica	
Fecha de tope para entrega de obra:	17 de marzo de 2024	

Resultado de Fiscalización: Mediante trámite sissol 2024-2840 del 18 de enero de 2024 y el contratista presenta la planilla de avance 2, luego de verificada la construcción por fiscalización en el sitio de la obra, establece que los trabajos objeto de la planilla son "satisfactorios constructivamente", por lo que se recomienda proceder al pago conforme indica el contrato en las Condiciones Especiales del Contrato CEC 51.1, como se indica a continuación:

CEC 51.1	"... Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizará contra presentación y aprobación de planillas <u>Bimestrales</u> que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberá contar con el Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra. ..."
----------	--

Ing. V. Uyaguan
Continuar con el proceso
de pago. *[Firma]* 07-02-2024

Aspectos económicos: La construcción de obra objeto del contrato tiene una ejecución acumulada de US\$ 115,972.73 que corresponde al 46.14% del valor contratado, hasta la fecha de la presentación de la planilla de avance:

TRÁMITE SISSOL	FECHA DE TRÁMITE SISSOL	PLANILLA DE AVANCE	VALOR PLANILLA DE AVANCE (NO INCLUYE IVA)
2023-47069	2023-11-17	PLANILLA 1	14,453.47
2024-2840	2024-01-18	PLANILLA 2	101,519.26
		TOTAL:	115,972.73

Los valores planillados se resumen a continuación:

ITEM	NOMBRE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PLANILLA 1	PLANILLA 2	TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
		VALOR SIN IVA	VALOR SIN IVA	VALOR SIN IVA
1	REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA	14,453.47	101,519.26	115,972.73
		5.75%	40.39%	46.14%

Programa de avance: El contratista presenta en planillas un valor mayor al determinado en el programa de avance que establece hasta el cuarto mes (segundo bimestre) un valor acumulado de US\$ 115,956.00 (no incluye IVA), por lo que no hay atraso en el programa de avance presentado en la oferta, por tanto, no aplica multa por demora en el programa de avance establecida en las Condiciones Especiales del Contrato CEC 49.1

CEC 49.1	<i>"El contratista deberá indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra por un valor del (1/1000) del valor pendiente de ejecución del contrato, sin considerar el IVA, por cada día de atraso, conforme al programa aprobado por el administrador del contrato, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. ..."</i>
----------	---

Vigencia de las pólizas: Las pólizas se encuentran vigentes como se indica a continuación:

FECHA DE VIGENCIA DE POLIZAS	
BUEN USO DE ANTICIPO	FIEL CUMPLIMIENTO
10/02/2024	13/08/2024

Seguridad y salud del trabajo: Se ha cumplido con la presentación de la documentación de seguridad como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	TRÁMITE SISSOL	FECHA ENTREGA
CARPETA DE SEGURIDAD INICIAL	2023-43894	25/10/2023
CARPETA DE SEGURIDAD MES 1	2023-45694	08/11/2023
CARPETA DE SEGURIDAD MES 2	2023-49610	08/12/2023

CARPETA DE SEGURIDAD MES 3	2023-50477	11/12/2023
CARPETA DE SEGURIDAD MES 4	2023-1286	12/01/2024

Informe ambiental: Presenta la documentación mensual de cumplimiento de la guía de buenas prácticas ambientales hasta el mes de diciembre, faltando el informe del mes de enero, como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	TRÁMITE DE ENTREGA SISSOL	FECHA DE ENTREGA
CARPETA AMBIENTAL MES 1	2023-51488	15/12/2023
CARPETA AMBIENTAL MES 2	2023-51489	15/12/2023
CARPETA AMBIENTAL MES 3	2023-51490	15/12/2023
CARPETA AMBIENTAL MES 4	2024-5361	02/02/2024

Informe de uso del anticipo: El contratista presenta la justificación del uso del anticipo sin existir novedades, mediante los siguientes documentos:

TRÁMITE DE ENTREGA SISSOL	FECHA DE ENTREGA
2024-3073	22/01/2024

Personal, equipos, herramientas, cronograma valorado y metodología: El contratista cumple con los requisitos solicitados en el pliego sin existir novedades, mediante los siguientes documentos:

TRÁMITE DE ENTREGA SISSOL	FECHA DE ENTREGA
2023-45899	09/11/2023

Cumplimiento de especificaciones de materiales: El contratista no ha presentado el formulario de cumplimiento de especificaciones de técnicas de materiales y cumplimiento de normas.

Particular que informo para el trámite de pago de la planilla No. 2 del contrato para lo cual se adjuntan los documentos respectivos.

Atentamente,



Escaneado y certificado por:
VICTOR HUGO
UYAGUARI DIAZ


Ing. Víctor Uyaguari Díaz
JEFE SECCIÓN TÉCNICA (E)
FISCALIZADOR

Anexo: Fotografías

Adjunto: Documento para pago de planilla de avance No. 2

ANEXO: FOTOGRAFÍAS



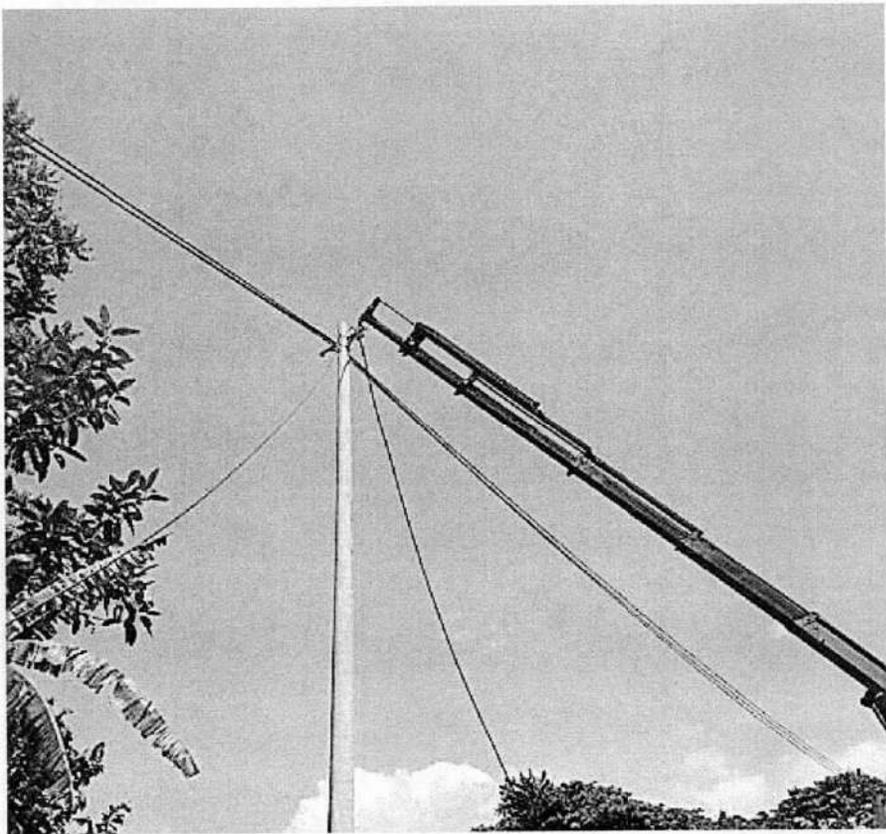





G&S no. 1210
INGENIEROS

G&S INGENIEROS CIA. LTDA.

¡Energía a sus ideas!

PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

Ofic. G&S-JICA-CH-015-2024
Tena, 18 de enero de 2024

INGENIERO
NELSON MUSO
DIRECTOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE LA ZONA ORIENTAL NAPO
Presente. -

REFERENCIA: CONTRATO No. 126-2023 "SUMINISTRO DE MATERIALES, DIRECCIÓN TÉCNICA Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO ETAPA" (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-007)

	DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO SECRETARÍA - DIRECCIÓN
18 ENE 2024	
Trámite No. _____	2840
Recibido por: _____	

ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTACIÓN DE AVANCE PLANILLA 2

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de la carpeta con la documentación de avance de la planilla 2 del contrato de la referencia.

Por la favorable atención que se sirva dar al presente anticipo mis sinceros y debidos agradecimientos.

Atentamente,



CHRISTIAN RUBEN
VACA FARINANGO

Ing. Christian Vaca F.
GERENTE GENERAL
G&S INGENIEROS CÍA. LTDA.
RUC.: 0591706306001
CONTRATISTA

*Ing. V. Uyaguan
su revision e
informe.*

Ing. M. Chagaba.

*Envado informe al
SISOL*

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

TRAMITE PRESUPUESTARIO 320

ESTADO AUTORIZADO

AGENCIA: NAPO

FECHA: 01/02/2024 16:08:48

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO

TOTAL TRAMITE: 62,941.95

ETAPA FUN: DISTRIBUCIÓN

Fecha Imp: 01/02/2024 16:14:10

DESCRIPCIÓN: PAGO PLANILLA 2 CTTO 126-2023 -PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN NO. JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-00'

CON SEGUIMIENTO: S N° CERTIFICACION: 325

Fecha Aprob: 01/02/2024 16:13:27

DPTO	PARTIDA	COMPROMISO	DEVENGADO
DZON	12101020101492316017432370602 1 4128 REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA	.00	62,941.95
TOTAL:		.00	62,941.95

FINANCIAMIENTO:



Uyaguari Diaz Victor Hugo

UYAGUARI DIAZ VICTOR HUGO

SOLICITADO POR:



Muso Duchitanga Nelson Patricio

MUSO DUCHITANGA NELSON PATRICIO

VISTO BUENO:

BRUIZ 01/02/2024 16:14:10

Página 1 de 1

EN VISTA QUE EXISTE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE AUTORIZA LA CONTINUACIÓN DEL TRAMITE RESPECTIVO. ATT. PRESUPUESTOS.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A. REGIONAL CENTRO NORTE

Ambato, 2/5/2023 15:22:49

TRAMITE CERTIFICACION 684 PRESUPUESTARIA

ESTADO: AUTORIZADO

Fecha Aprob: 28/4/2023 16:17:05

DF-PRE-1408-2023

2 de Mayo de 2023

La Dirección Financiera, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., CERTIFICA la existencia presente y futura de los recursos suficientes para atender el compromiso solicitado por el DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO que consta en Memorando No DZON-ST-373-2023 del 28 de Abril de 2023.

El monto de este compromiso asciende a US\$ 292,055.36 (incluido IVA) según el siguiente detalle:

DPTO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA	COD. RAP.	DESCRIPCIÓN	VALOR
DZON	1210102010149231601743237060203	I 4128	REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA	\$211,218.61
FINANCIAMIENTO:				SUBTOTAL: \$211,218.61
Tipo Recurso	Valor			
RECURSOS PROPIOS	109833.68	2024		80,836.75
CREDITO JICA	101384.93			
TOTAL:				\$292,055.36

RECURSOS PROPIOS

2024: 80,836.75

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FUTURA

En la proforma presupuestaria de los años (2024) se considerará el valor de US\$ 80,836.75 (2024); sobre la base de lo indicado el valor total del proceso asciende a US\$ 292,055.36.

Elaborado por:



CARLOS MARTIN
CRESPO ARAUJO

Dr. MARTIN CRESPO A., Mg.

JEFE(A) DE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:



JORGE WELLINGTON
ROSERO CASTRO

Dr. JORGE ROSERO C., Mg.

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) (E)



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A Y AVANCE DE OBRAS

AVANCE PLANILLA 2

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECCIÓN: GRUPO# 4 COMERCIALIZACION

SECTOR: REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATO: 126/2023

CONTRATISTA: G&S Ingenieros Cia. Ltda.

PROYECTO: REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA

PARTIDA PRESUP: 1210102010149231601743237060203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	AVANCE CONST.	
1	2023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE HORMIGÓN 12 m 2,000 kg	C/U	989,67	989,67	5,00000	4948,35	4948,35	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	465	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE HORMIGÓN 12 m 500 kg	C/U	281,26	281,26	65,00000	18281,90	18281,90	19,00000	5343,94	5343,94	29,23	29,23	
3	2672	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F SEMIASLADA ANGLADA DE RETENCIÓN COMPACTA	C/U	929,69	929,69	5,00000	4648,45	4648,45	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2673	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F SEMIASLADA ANGLADA DE RETENCIÓN COMPACTA 7"- 60"	C/U	493,42	493,42	7,00000	3453,94	3453,94	12,00000	5921,04	5921,04	171,43	171,43	
5	2675	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F SEMIASLADA DOBLE RETENCIÓN COMPACTA	C/U	2821,52	2821,52	8,00000	22572,16	22572,16	2,00000	5643,04	5643,04	25,00	25,00	
6	2679	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F SEMIASLADA DOBLE RETENCIÓN SIN MENSAJERO	C/U	1613,19	1613,19	2,00000	3226,38	3226,38	6,00000	9679,14	9679,14	300,00	300,00	
7	2680	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F SEMIASLADA ESPACIADOR	C/U	68,02	68,02	822,00000	55912,44	55912,44	175,00000	11903,50	11903,50	21,29	21,29	
8	2671	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F SEMIASLADA PASANTE COMPACTA	C/U	231,00	231,00	230,00000	53130,00	53130,00	104,00000	24024,00	24024,00	45,22	45,22	
9	2674	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 KV 3F SEMIASLADA RETENCIÓN COMPACTA	C/U	848,88	848,88	8,00000	6791,04	6791,04	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	2751	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1F DE 15 KV 100 A	C/U	242,56	242,56	4,00000	970,24	970,24	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	2752	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3F DE 15 KV 100 A	C/U	564,95	564,95	2,00000	1129,90	1129,90	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	2038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 1F DE 15 KV 200 A	C/U	349,95	349,95	1,00000	349,95	349,95	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	2039	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 3F DE 15 KV 200 A	C/U	877,60	877,60	1,00000	877,60	877,60	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	2565	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN A 13,8 KV	C/U	84,26	84,26	10,00000	842,60	842,60	15,00000	1263,90	1263,90	150,00	150,00	
15	2681	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR MENSAJERO DE ALUMINUMWELD # 052 AWG (km)	C/U	7190,65	7190,65	3,00000	21571,95	21571,95	0,19600	1409,37	1409,37	6,53	6,53	
16	2753	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR SEMIASLADO O ECOLÓGICO 15 KV ACSR # 20 AWG (km)	km	5060,82	5060,82	9,00000	45547,38	45547,38	6,91300	34985,45	34985,45	76,81	76,81	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:							244254,28	244254,28	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A:	100173,38	100173,38			

Porcentaje de avance 23.13 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



CHRISTIAN RUBEN
VACA FARINANGO

G&S Ingenieros Cia. Ltda.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$ 0,00
TARIFA GRAVADO CON IVA (12): 100173,38
+ Iva (12): 12020,81
VALOR A LIQUIDAR : \$ 112194,19
- VALOR DE ANTICIPO : \$ 50086,69
SUBTOTAL : \$ 62107,50
TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD A : \$ 62107,50

Aprobado - fecha



VICTOR HUGO
UYAGUANI DIAZ

Ing. Victor Hugo Uyaguani Diaz

Fiscalizador



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

FISCALIZACIÓN DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B Y AVANCE DE OBRAS

AVANCE PLANILLA 2

DEPARTAMENTO: DZO NAPO

SECCIÓN: GRUPO# 4 COMERCIALIZACION

ORDEN DE TRABAJO:

SECTOR: REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA

CONTRATO: 126/2023

CONTRATISTA: G&S Ingenieros Cia. Ltda.

PROYECTO: REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA

PARTIDA PRESUP: 1210102010149231601743237060203

FISCALIZACIÓN: Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

01/02/2024 Página 1 de 2

VALORES CONTRATADOS CONSTRUCCIÓN										PLANILLA ACTUAL CONSTRUCCÓN			AVANCE CONST.	
#	COD	ITEMS	UNID.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.FD	CAN. CONTRATAD	TOTAL SIN FD.	TOTAL CON FD.	CANT. ACTUAL	TOTAL ACTUAL	TOTAL ACTUAL FD.	AVA. % PLANILLA	AVANCE CONST.	
1	753	DESBRUCE (km)	km	115,46000	115,46	2,00000	230,92	230,92	2,01700	232,88	232,88	100,85	0,00	
2	144	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TENSORES AL ARCOIS	C/U	0,51000	0,51	13,00000	6,63	6,63	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	143	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TRANSFORMADORES AL ARCOIS INCLUYE SECCIONADORES Y PUESTA A TIERRA DEL TRAFIO	C/U	1,03000	1,03	3,00000	3,09	3,09	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	142	LEVANTAMIENTO E INGRESO DE REGULADORES, CAPACITORES, RECONECTADORES O SECCIONADORES AL ARCOIS (EXCEPTO SECCIONADORES DE TRANSFORMADORES)	C/U	0,51000	0,51	15,00000	7,65	7,65	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	140	Levantamiento e ingreso de postes en ARCOIS incluye rotas, estructuras de medio y bajo voltaje y puestas a tierra de fin de línea. NO incluye pintado y/o colocación de placa de numeración en poste.	C/U	1,54000	1,54	124,00000	190,96	190,96	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	2374	MANEJO AMBIENTAL (MENSUAL)	C/U	148,40000	148,40	6,00000	890,40	890,40	2,00000	296,80	296,80	33,33	0,00	
7	148	NUMERACION DE LUMINARIA Y/O COLOCACION DE PLACA EN POSTE O SECCIONADOR	C/U	1,25000	1,25	2,00000	2,50	2,50	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	149	PINTADO DE NUMERACION DE POSTES (TRABAJOS EXCLUSIVOS PARA REFINADO DE POSTES)	C/U	1,43000	1,43	6,00000	8,58	8,58	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	1	RECUBRIMIENTO, REPLANTEO E INVENTARIO POR KM DE RED (PROYECTO)	km	129,68000	129,68	3,00000	389,04	389,04	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	2373	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (MENSUAL)	C/U	408,10000	408,10	6,00000	2448,60	2448,60	2,00000	816,20	816,20	33,33	0,00	
11	24	TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR # 10 Y 20 AWG (km)	km	217,36000	217,36	1,00000	217,36	217,36	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	2533	TRANSPORTE DE POSTE HORMIGÓN 10 m 400 kg	C/U	36,79000	36,79	1,00000	36,79	36,79	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	2534	TRANSPORTE DE POSTE HORMIGÓN 11 m 400 kg	C/U	39,09000	39,09	1,00000	39,09	39,09	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	2532	TRANSPORTE DE POSTE HORMIGÓN 9 m 350 kg	C/U	34,49000	34,49	1,00000	34,49	34,49	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADO CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:							4506,10	4506,10	TOTAL MANO DE OBRA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B:	1345,88	1345,88	1345,88	0,00	

Porcentaje de avance 31.6 %

FÓRMULA: FD = 1

FD: 1

Distancia al proyecto desde las bodegas de la EEASA en 0

Observación:

Elaborado - fecha



INGENIERO CONSULTOR EN SISTEMAS DE RIEGO
CHRISTIAN RUBEN
VACCA FARINANGO

G&S Ingenieros Cia. Ltda.

Contratista

TARIFA GRAVADO CON IVA (0 %) : \$

0,00

TARIFA GRAVADO CON IVA (12):

1345,88

+ Iva (12):

161,51

VALOR A LIQUIDAR : \$

1507,39

- VALOR DE ANTICIPO : \$

672,94

SUBTOTAL : \$

834,45

TOTAL PLANILLA CONSTRUCCION DE REDES COMPLEJIDAD B : \$

834,45

Aprobado - fecha



INGENIERO CONSULTOR EN SISTEMAS DE RIEGO
VICTOR HUGO
UYAGUARI DIAZ

Ing. Victor Hugo Uyaguari Diaz

Fiscalizador



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL 2

CONTRATO 126-2023 (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-007)

En la ciudad de Tena, se constituyen por una parte el Ing. Nelson Muso Duchitanga administrador o gerente de obras del contrato, el Ing. Xavier Moreno Núñez técnico que no participó en la ejecución del contrato por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. y por otra G&S INGENIEROS CÍA. LTDA. con RUC 0591706306001 representado legalmente por el Ing. Christian Vaca Farinango contratista para el SUMINISTRO DE MATERIALES, DIRECCIÓN TÉCNICA Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA, para suscribir la presente acta de entrega recepción.

Contrato de trabajo No:	126-2023 (JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-007)	
Fecha de suscripción del contrato:	11 de septiembre de 2023	
Fecha de inicio contrato (día establecido por el administrador del contrato):	19 de septiembre de 2023	Oficio EEASA-DZON-DIR-122-2023
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIALES, DIRECCIÓN TÉCNICA Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA	
Valor del contrato sin IVA:	US\$ 251,366.78	
Plazo:	Ciento ochenta (180) días calendario	
Ampliación de plazo:	No aplica	
Fecha de tope para entrega de obra:	17 de marzo de 2024	

Resultado de Fiscalización: Mediante trámite sissol 2024-2840 del 18 de enero de 2024 el contratista presenta la planilla de avance 2, luego de verificados los rubros presentados en la planilla de avance, establece que los trabajos objeto de la planilla son "satisfactorios constructivamente" y se remite el informe al Gerente de Obras en memorando DZON-ST-097-2024, por lo que se recomienda proceder al pago conforme indica el contrato en las Condiciones Especiales del Contrato CEC 51.1, como se indica a continuación:

CEC 51.1	<p>“... <i>Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizará contra presentación y aprobación de planillas <u>Bimestrales</u> que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberá contar con el Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra.</i> ...”</p>
----------	--

Aspectos económicos: La construcción de obra objeto del contrato tiene una ejecución acumulada de US\$ 115,972.73 que corresponde al 46.14% del valor contratado, hasta la fecha de la presentación de la planilla de avance:



TRÁMITE SISSOL	FECHA DE TRÁMITE SISSOL	PLANILLA DE AVANCE	VALOR PLANILLA DE AVANCE (NO INCLUYE IVA)
2023-47069	2023-11-17	PLANILLA 1	14,453.47
2024-2840	2024-01-18	PLANILLA 2	101,519.26
		TOTAL:	115,972.73

Los valores planillados se resumen a continuación:


ITEM	NOMBRE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PLANILLA 1	PLANILLA 2	TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
		VALOR SIN IVA	VALOR SIN IVA	VALOR SIN IVA
1	REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA	14,453.47	101,519.26	115,972.73
		5.75%	40.39%	46.14%

Programa de avance: El contratista presenta en planillas un valor mayor al determinado en el programa de avance que establece hasta el cuarto mes (segundo bimestre) un valor acumulado de US\$ 115,956.00 (no incluye IVA), por lo que no hay atraso en el programa de avance presentado en la oferta, por tanto, no aplica multa por demora en el programa de avance establecida en las Condiciones Especiales del Contrato CEC 49.1

CEC 49.1	<i>"El contratista deberá indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra por un valor del (1/1000) del valor pendiente de ejecución del contrato, sin considerar el IVA, por cada día de atraso, conforme al programa aprobado por el administrador del contrato, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. ..."</i>
----------	---

Mediante memorando PE-0358-2024 del 7 de febrero de 2024, la Presidencia Ejecutiva de la EEASA remite la resolución No. 0051-2024 para cambio de administrador del contrato, designando al Ing. Nelson Muso D.

Para constancia y aceptación de lo anotado, firman el 08 de febrero del 2024 las partes:



Ing. Nelson Muso D.
ADMINISTRADOR -
GERENTE DE OBRAS



Ing. Christian Vaca Farinango
G&S INGENIEROS CÍA. LTDA.



Ing. Xavier Moreno Núñez
TÉCNICO QUE NO PARTICIPÓ
EN LA EJECUCIÓN
